

事務事業評価シート 令和 1 年度事後評価・決算

令和 3 年 2 月 22 日時点

事務事業計画シート						所管課		建設課		担当班	土木班
事務事業名		29800	蛇園南地区流末排水整備事業	予算科目	会計	款	項	目	事業種別	☒ 主な事業	
				根拠法令	一般	8	2	3		☒ 国土強靱化地域計画	
施策体系	基本施策	21	良好な生活環境の形成	戦略事業	192	蛇園南地区流末排水整備事業				☒ 新市建設計画	
	施策の展開	39	住み良い住環境の確保	戦略事業						☐ 定住自立圏構想	
	施策の展開			戦略事業						☐ 主要事業	

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない		
☐ 単年度繰返 ☐ 平成 年度～ ☐ 開始年度不詳 ☒ 期間限定複数年度 平成 21 年度～ 令和 2 年度まで	蛇園地区における道路排水流末の未整備による道路冠水被害を改善する。		
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化		⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
蛇園地区は、道路排水の流末が未整備であるため、台風や大雨時には多くの冠水被害に見舞われてきた。このため、雨水の円滑な排水により道路冠水被害を改善し、当地域の安心・安全な生活環境の向上を図る。	施工区間沿線の家屋・店舗・耕作者等との調整。		蛇園地区住民から早期の整備完了を望まれている。

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(1年度の決算)		単位:千円	単位	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(決算)	1年度(決算)	2年度(予算)
1.工事請負費	77,314	道路排水工事	千円	305,645	189,415	166,487	77,314	
2.委託料	10,272	調査・設計委託料	千円	3,969	2,441	309	10,272	
3.負担金補償及び交付金			千円	16,117				
4.補償補填及び補償金		損害賠償金	千円	6,774	6,219	242		
5.その他			千円					
② 特定財源の内訳(1年度の決算)		単位:千円	事業費計 (A)					
1.国庫支出金		社会資本整備総合交付金	千円	332,505	198,075	167,038	87,586	
2.都道府県支出金		基盤整備事業に伴う県負担金	千円		11,990			
3.地方債	83,200	蛇園南地区流末排水整備事業債	千円	311,900	176,700	154,200	83,200	
4.その他		繰越金	千円	2,296				
			千円	18,309	9,385	12,838	4,386	

前年度増減理由	整備延長が減ったため
---------	------------

従事職員数 常時 1 人 最大 人 × 日 = 延べ 人

(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標


手段	① 主な活動	③ 活動指標名	単位	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(計画)
	1年度実績(1年度に行った主な活動)							
	排水路整備工事 L=119m	ア 整備延長	m	408	395	440	119	0
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	単位	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(計画)
	蛇園南地区流末排水路 排水路が整備される。							
		ア 整備率	%	71.5	83.0	95.9	99.4	100.0
		イ						

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果		成果向上余地		
施策貢献度	大きい	かなりある	ある程度ある	ほとんどない
			②	
普通				
小さい				

② コスト削減優先度評価結果		コスト比率		
評価結果	①	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
成果優先度	②			
		(2)		
③				
④⑤				
⑥				
⑦⑧				
⑨				

(5) 成果指標の動向

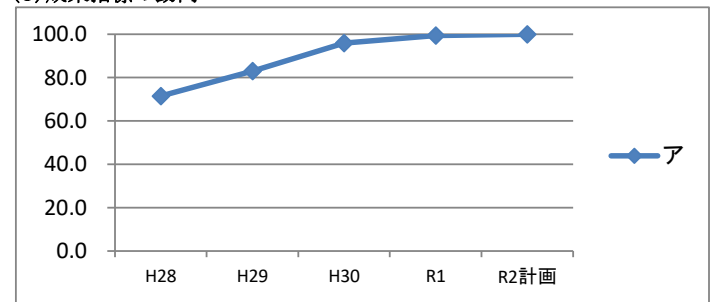

(6) 事務事業に関する評価

評価内容	① 進捗状況	☐ 完了 ☐ 順調 ☒ 概ね順調 ☐ 停滞 ☐ 実施困難				
	【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)					
	② 成果の状況	成果指標ア	成果指標のタイプ	数値増＝成果向上	☒ 向上 ☐ 横ばい ☐ 低下 ☐ 向上 ☐ 横ばい ☐ 低下	比較
	【コメント】 (低下の場合、その理由)	成果指標イ				成果動向
	③ 今年度取組事項 (2年度に取り組む主な事項について記載)	時期	内容		今後の方向性	
		令和2年度	令和元年度繰越分を完成し、排水路整備は完了となる。		令和2年4月	蛇園南地区流末排水路の3,425mを整備完了したため、事業を廃止する。
