

事務事業評価シート 令和 2 年度事後評価・決算

令和 4 年 2 月 10 日時点

事務事業名	コード	29900	旭中央病院アクセス道整備事業	予算科目	会計	一般	款	8	項	2	目	3	事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input checked="" type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input checked="" type="checkbox"/> 新市建設計画 <input checked="" type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input type="checkbox"/> 主要事業
所管課	建設課			担当班	土木班									
基本施策	17	安全で快適な道路の整備		根拠法令	道路法									
施策の展開	34	主要道路の整備		戦略事業	157 旭中央病院アクセス道の整備(南北線)									
施策の展開				戦略事業										

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるように記述する、行政用語は使わない	
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 平成 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 18 年度～ 令和 2 年度まで	東総広域農道琴田地先から旭警察署の東側を經由し、旭中央病院に至る道路を整備する。 L=3,200m,W=11.5m	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
円滑な交通網を整備することにより、国道及び市街地の慢性的な交通渋滞を解消し、交通利便性の向上や歩行者の安全性の確保を図る。	旭中央病院周辺では慢性的な交通渋滞が発生し、緊急車両等の通行に支障をきたしている。	特になし

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(2年度の決算) 単位:千円	
1. 工事請負費	233,832 道路改良工事
2. 公有財産購入費	道路用地購入費
3. 補償補填及び賠償金	補償金
4. 委託料	1,858 調査・設計委託料
5. その他	土地等借上料
② 特定財源の内訳(2年度の決算) 単位:千円	
1. 国庫支出金	88,187 社会資本整備総合交付金
2. 都道府県支出金	
3. 地方債	137,800 旭中央病院アクセス道整備事業債
4. その他	

費目内訳	単位	29年度(決算)	30年度(決算)	1年度(決算)	2年度(決算)	3年度(予算)
1. 工事請負費	千円	82,358	214,923	202,329	233,832	190,300
2. 公有財産購入費	千円	30,798	10,298	860		
3. 補償補填及び賠償金	千円	6,389	3,656			
4. 委託料	千円	648	1,873	601	1,858	
5. その他	千円		227			
事業費計(A)	千円	120,193	230,977	203,790	235,690	190,300
1. 国庫支出金	千円	10,649	31,166	42,200	88,187	37,400
2. 都道府県支出金	千円					
3. 地方債	千円	95,700	186,900	153,300	137,800	145,200
4. その他	千円	192				
5. 一般財源	千円	13,652	12,911	8,290	9,703	7,700

前年度増減理由	整備延長が増加し、工事費が増加した。また、全ての用地が取得済みとなったため、公有財産購入費・補償補填及び賠償金が減少した。
---------	---

従事職員数 常時 2人 最大 人 × 日 = 延べ 人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	③ 活動指標名	単位	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(実績)	3年度(計画)
	2年度実績(2年度に行った主な活動) 道路改良工事 L=2,556m	ア 整備延長(単年度)	m	220	1,171	660	2,556	249
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	イ 用地取得率(面積ベース)	%	94.6	97.6	100.0	100.0	100.0
	対象意図 市道及び利用者 安全かつ円滑な交通の確保	④ 成果指標名	単位	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(実績)	3年度(計画)
		ア 道路整備延長	m	1,120	2,291	2,951	2,951	3,200
		イ 整備率	%	35.0	71.6	92.2	92.2	100.0

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果		② コスト削減優先度評価結果		
施策貢献度	成果向上余地	コスト比率		
	かなりある	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	ある程度ある			
大きい	①	(1)		
普通				
小さい				

(5) 成果指標の動向

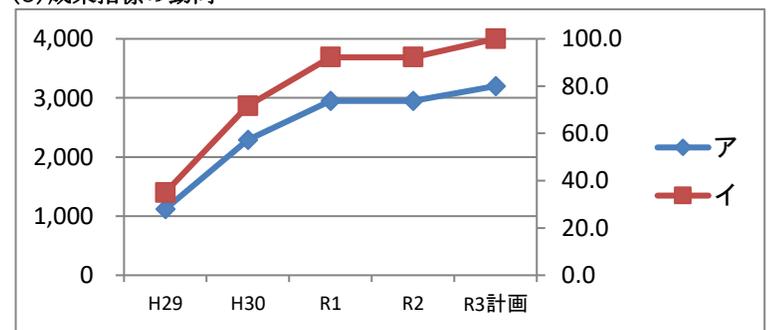

(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難				
【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)					
② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値増=成果向上	向上	<input checked="" type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下
【コメント】 (低下の場合、その理由)	成果指標Aのタイプ	成果指標Bのタイプ	数値増=成果向上	向上	<input checked="" type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下
③ 今年度取組事項 (3年度に取り組む主な事項について記載)	時期	内容	今後の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小	現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> その他(完了)
	令和3年度	取得済用地の道路改良工事を行う			
