

事務事業評価シート 令和 2 年度事後評価・決算

令和 4 年 2 月 10 日時点

事務事業名	コード	43300	サッカー場整備事業	予算科目	会計	款	項	目	事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input type="checkbox"/> 新市建設計画 <input type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業
基本施策	6	スポーツの振興	根拠法令	特になし						
施策の展開	15	スポーツ施設の維持管理	戦略事業	70	サッカー場整備事業					
施策の展開			戦略事業							

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 令和 2 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 年度～ 令和 年度まで	東日本大震災後、飯岡地域の海岸線沿いは空洞化が進んでいる。旧飯岡中学校跡地を利用し、サッカー場等、スポーツを通じて人々の交流の場となるスポーツ施設を建設する。
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化
平成29年10月11日に「旭市旧中学校跡地利用検討委員会」が設置され、5回にわたる検討の結果、平成30年8月の報告書で旧飯岡中学校跡地はサッカー場等のスポーツ関連施設で活用することで意見が集約された。サッカー場等の建設に向けた準備を進めている状況である。	建設費、施設維持管理費等のコストを縮減し、かつ使用料の適正な価格設定が必要である。また、施設稼働率を上げるための活用方針検討が課題である。
⑤ 事務事業に対する住民からの意見等	
市内にサッカー場が無いいため、サッカー関係団体から以前より施設整備の要望がある。	

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(2年度の決算) 単位:千円	
1.設計・監理委託料	7,751 旭市サッカー場整備事業実施設計業務委託
2.工事請負費	
② 特定財源の内訳(2年度の決算) 単位:千円	
1.国庫支出金	
2.都道府県支出金	
3.地方債	
4.その他	7,750 ふるさと応援基金繰入金

事業費	費目内訳	1.設計・監理委託料	千円				7,751	
		2.工事請負費	千円					408,952
財源	事業費計(A)		千円				7,751	408,952
	1.国庫支出金	千円						
	2.都道府県支出金	千円						
	3.地方債	千円						342,900
	4.その他	千円					7,750	60,106
	5.一般財源	千円					1	5,946

前年度増減理由	
---------	--

従事職員数 常時 2人 最大 人 × 日 = 延べ 人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	③ 活動指標名	単位	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(実績)	3年度(計画)
	2年度実績(2年度に行った主な活動) ・旭市サッカー場整備事業実施設計業務委託	ア 整備箇所数	箇所				0	1
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	単位	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(実績)	3年度(計画)
	対象意図 市民及びサッカー場利用者 サッカー場を計画的に整備し供用開始	ア 事業進捗率	%				2.7	96.4

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果			② コスト削減優先度評価結果			
施策貢献度	大きい	成果向上余地	成果優先度評価結果	コスト比率		
	普通	かぎりある		下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	小さい	ある程度ある		①	②	③
		ほとんどのない	④⑤	⑥	⑦⑧	
			⑨			

(5) 成果指標の動向

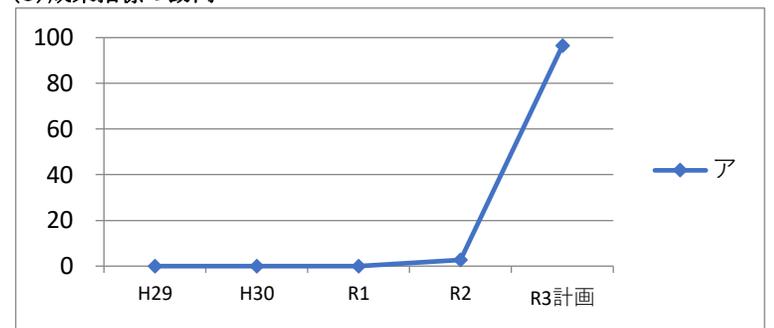

(6) 事務事業に関する評価

評価内容	① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難	
	② 成果の状況	成果指標ア 成果指標イ	
	③ 今年度取組事項	時期 令和4年3月まで 内容 旭市サッカー場整備工事 旭市サッカー場管理棟改修工事 運用方針決定(使用料・利用方法等)	
比較	28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3計画	成果動向	ア 0.0 0.0 0.0 2.7 93.7 イ
今後の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> その他()	令和4年度以降 照明灯具の設置 施設の適正な運営及び維持管理
