

事務事業名	29800 蛇園南地区流末排水整備事業	予算科目	会計 一般	款 8	項 2	目 3	所管課	建設課	担当班	土木班	
基本施策	21 良好な生活環境の形成	根拠法令					事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input checked="" type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input checked="" type="checkbox"/> 新市建設計画 <input type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業			
施策の展開	39 住み良い住環境の確保	戦略事業	192	蛇園南地区流末排水整備事業							
施策の展開		戦略事業									

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない				
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 平成 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 21 年度～ 平成 32 年度まで	蛇園地区における道路排水流末の未整備による道路冠水被害を改善する。				
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化		⑤ 事務事業に対する住民からの意見等		
蛇園地区は、道路排水の流末が未整備であるため、台風や大雨時には多くの冠水被害に見舞われてきた。このため、雨水の円滑な排水により道路冠水被害を改善し、当地域の安心・安全な生活環境の向上を図る。	施工区間沿線の家屋・店舗・耕作者等との調整。		蛇園地区住民から早期の整備完了を望まれている。		

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細 (27年度の決算) 単位:千円		単位	24年度 (決算)	25年度 (決算)	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (予算)
1. 工事請負費	396,281	千円	155,269	157,158	491,064	396,281	323,842
2. 委託料	2,080	千円	9,298	1,296	1,246	2,080	324
3. 負担金補償及び交付金	1,620	千円	1,659			1,620	21,989
4. 補償補填及び補償金	3,084	千円	749	1,406	143	3,084	
5. その他	143	千円	2	1		143	
② 特定財源の内訳 (27年度の決算) 単位:千円		事業費計 (A)					
1. 国庫支出金	90,915	千円	166,977	159,861	492,453	403,208	346,155
2. 都道府県支出金	0	千円	61,910	39,360	98,640	90,915	0
3. 地方債	279,500	千円	99,700	110,900	372,600	279,500	306,400
4. その他	21,747	千円	3,264	5,755	17,699	21,747	
		千円	2,103	3,846	3,514	11,046	39,755

前年度増減理由	整備延長が減ったため
---------	------------

従事職員数 常時 1人 最大 人 × 日 = 延べ 0人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	⇒	③ 活動指標名	単位	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)
	27年度実績 (27年度に行った主な活動) 排水路整備工事 L=505m		ア 整備延長	m	316	280	551	505	414
目的	② 対象・意図 (対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)
	対象意図 蛇園南地区流末排水路 排水路が整備される。		ア 整備率	%	20.6	28.7	44.8	59.6	71.7

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果			② コスト削減優先度評価結果				
施策貢献度	大きい	成果向上余地 かなりある	評価結果	コスト比率			
	普通	ある程度ある		下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3	
	小さい	ほとんどない		①	②	③	
			④⑤	(4)	⑥	⑦⑧	⑨

(5) 成果指標の動向

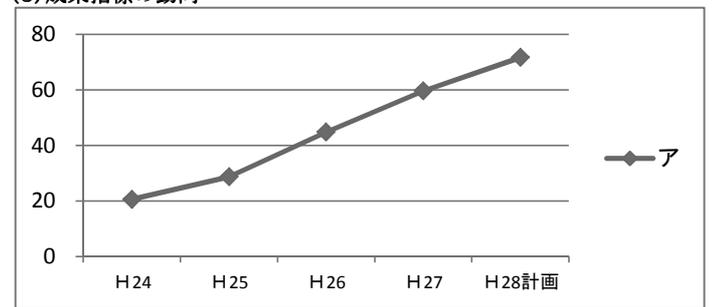

(6) 事務事業に関する評価

評価内容	① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難									
	② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値増=成果向上	<input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 <input type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下	比較	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
	【コメント】 (低下の場合、その理由)				成果動向	ア	7.6	8.1	16.1	14.8	12.1
③ 今年度取組事項	時期	内容		今後の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> その他 ()						
	H28年度	新たな施工区間(L=379m)の整備工事を行う									
