

事務事業評価シート 平成 27 年度事後評価・決算

平成 29 年 2 月 22 日時点

事務事業名		29900 旭中央病院アクセス道整備事業	予算科目	会計 一般	款 8	項 2	目 3	所管課	建設課	担当班	土木班	
施策体系	基本施策	18 安全で快適な道路の整備	根拠法令	道路法				事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input checked="" type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input checked="" type="checkbox"/> 新市建設計画 <input checked="" type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業			
	施策の展開	33 主要道路の整備	戦略事業	158 旭中央病院アクセス道の整備(南北線)								
	施策の展開		戦略事業									

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 平成 18 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 18 年度～ 平成 31 年度まで	東総広域農道琴田地先から旭警察署の東側を經由し、旭中央病院に至る道路を整備する。 L=3,200m,W=11.5m	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
円滑な交通網を整備することにより、国道及び市街地の慢性的な交通渋滞を解消し、交通利便性の向上や歩行者の安全性の確保を図る。	旭中央病院周辺では慢性的な交通渋滞が発生し、緊急車両等の通行に支障をきたしている。	

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細 (27年度の決算) 単位:千円								
1. 工事請負費	0	道路改良工事	24年度(決算)	25年度(決算)	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(予算)	
2. 公有財産購入費	21,914	道路用地購入費		26,108	46,475	21,914	132,517	
3. 補償補填及び賠償金	62,263	補償金		29,348	62,263	183,912		
4. 委託料	2,624	調査・測量委託料	3,186	1,302	18,038	2,624	6,057	
5. その他	0							
② 特定財源の内訳 (27年度の決算) 単位:千円								
1. 国庫支出金	11,990	社会資本整備総合交付金	事業費計(A)	3,186	27,410	93,861	86,801	376,486
2. 都道府県支出金	0		1. 国庫支出金				11,990	54,120
3. 地方債	68,500	旭中央病院アクセス道整備事業債	2. 都道府県支出金					
4. その他	0		3. 地方債	3,000	25,600	71,000	68,500	292,500
				4. その他			10,368	
				5. 一般財源	186	1,810	12,493	29,866

前年度増減理由	事業計画によるものである
---------	--------------

従事職員数 常時 2人 最大 人 × 日 = 延べ 0人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	⇒	③ 活動指標名	単位	24年度(実績)	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)
	27年度実績 (27年度に行った主な活動) 用地買収 18件 A=2,805.74㎡ 物件補償 5件 建物・工作物外		ア 整備延長(単年度)	m	0	0	0	0	0
目的	② 対象・意図 (対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	24年度(実績)	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)
	対象意図 市道及び利用者 安全かつ円滑な交通の確保		イ 用地取得率(面積ベース)	%	0.0	9.3	36.0	61.3	74.6
対象意図	② 対象・意図 (対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	24年度(実績)	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画)
	対象意図 市道及び利用者 安全かつ円滑な交通の確保		ア 道路整備延長	m	900	900	900	900	900
対象意図	② 対象・意図 (対象がどのような状態になるのか)	⇒	イ 整備率	%	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果			② コスト削減優先度評価結果		
施策貢献度	成果向上余地		コスト比率		
	かなりある	ある程度ある	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	大きい	②	①	②	③
普通			④⑤	⑥	⑦⑧
小さい			⑨		

(5) 成果指標の動向

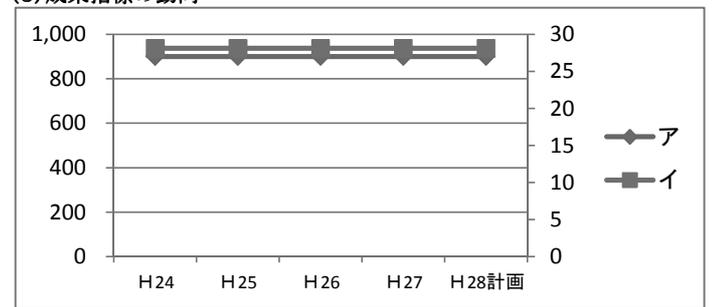

(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難									
② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値増=成果向上	<input type="checkbox"/> 向上 <input checked="" type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下	比較	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
③ 今年度取組事項	時期	内容	今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> その他 ()	成果動向	24年度	25年度	26年度	27年度	28計画
【コメント】(停滞・実施困難の場合、その理由)					ア		0	0	0	0
【コメント】(低下の場合、その理由)					イ		0.0	0.0	0.0	0.0
【コメント】(今年度新たに取組む事項について記載)				平成28年度～			計画に沿った道路改良工事を実施し、成果(整備率)の向上を図る。			
