

事務事業名	コード	29800	蛇園南地区流末排水整備事業	予算科目	会計	一般	款	8	項	2	目	3	所管課	建設課	担当班	土木班
基本施策	21	良好な生活環境の形成		根拠法令									事業種別	<input checked="" type="checkbox"/>	主な事業	
施策の展開	39	住み良い住環境の確保		戦略事業	192 蛇園南地区流末排水整備事業									<input checked="" type="checkbox"/>	国土強靱化地域計画	
施策の展開				戦略事業										<input type="checkbox"/>	新市建設計画	
施策の展開				戦略事業									<input type="checkbox"/>	定住自立圏構想		
施策の展開				戦略事業									<input checked="" type="checkbox"/>	主要事業		

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 平成 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 21 年度～ 平成 32 年度まで	蛇園地区における道路排水流末の未整備による道路冠水被害を改善する。	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
蛇園地区は、道路排水の流末が未整備であるため、台風や大雨時には多くの冠水被害に見舞われてきた。このため、雨水の円滑な排水により道路冠水被害を改善し、当地域の安心・安全な生活環境の向上を図る。	施工区間沿線の家屋・店舗・耕作者等との調整。	蛇園地区住民から早期の整備完了を望まれている。

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(29年度の決算) 単位:千円						
1. 工事請負費	189,415	道路排水工事				
2. 委託料	2,441	調査・設計委託料				
3. 負担金補償及び交付金	0	水道管切廻し工事負担金				
4. 補償補填及び補償金	6,219	損害賠償金				
5. その他	0					
② 特定財源の内訳(29年度の決算) 単位:千円						
1. 国庫支出金	0	社会資本整備総合交付金				
2. 都道府県支出金	11,990	基盤整備事業に伴う県負担金				
3. 地方債	176,700	合併特例債				
4. その他	0	繰越金				

事業費	費目内訳	単位	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(予算)
	1. 工事請負費	千円	491,064	396,281	305,645	189,415	216,000
	2. 委託料	千円	1,246	2,080	3,969	2,441	540
	3. 負担金補償及び交付金	千円	0	1,620	16,117	0	0
	4. 補償補填及び補償金	千円	143	3,084	6,774	6,219	18,000
	5. その他	千円	0	143	0	0	0
	事業費計(A)	千円	492,453	403,208	332,505	198,075	234,540
	財源	千円					
	1. 国庫支出金	千円	98,640	90,915		0	
	2. 都道府県支出金	千円				11,990	
3. 地方債	千円	372,600	279,500	311,900	176,700	222,800	
4. その他	千円	17,699	21,747	2,296	0		
5. 一般財源	千円	3,514	11,046	18,309	9,385	11,740	

従事職員数 常時 1人 最大 人 × 日 = 延べ 0人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	⇒	③ 活動指標名	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
	29年度実績(29年度に行った主な活動)		ア 整備延長	m	551	505	408	395	340
	排水路整備工事 L=395m		イ						
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
	対象意図		ア 整備率	%	44.8	59.6	71.5	83.0	93.0
	蛇園南地区流末排水路		イ						
	排水路が整備される。								

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果			② コスト削減優先度評価結果					
施策貢献度	大きい	成果向上余地	評価結果	コスト比率				
	普通	かなりある		ある程度ある	ほとんどない	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	小さい							
			①					
			②					
			③					
			④⑤					
			⑥		(8)			
			⑦⑧					
			⑨					

(5) 成果指標の動向

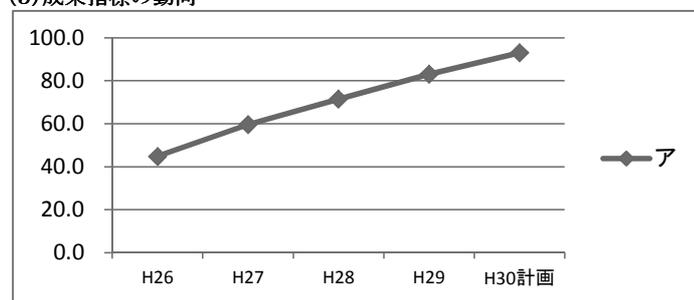

(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難										
【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)											
② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値増=成果向上	<input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 <input type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下	比較	25年度 26年度	26年度 27年度	27年度 28年度	28年度 29年度	29年度 30計画	
【コメント】 (低下の場合、その理由)					成果動向	ア	16.1	14.8	11.9	11.5	10.0
③ 今年度取組事項 (30年度に取り組む主な事項について記載)	時期	内容		今後の方向性	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> その他()						
	H30年度	新たな施工区間(L=340m)の整備工事を行う									
