

事務事業名	コード	29900	旭中央病院アクセス道整備事業	予算科目	会計	一般	款	8	項	2	目	3	所管課	建設課	担当班	土木班
基本施策	18	安全で快適な道路の整備	根拠法令	道路法	戦略事業	158	旭中央病院アクセス道の整備(南北線)						事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input checked="" type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input checked="" type="checkbox"/> 新市建設計画 <input checked="" type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		
施策の展開	33	主要道路の整備	戦略事業													
施策の展開			戦略事業													

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 平成 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 18 年度～ 平成 32 年度まで	東広域農道琴田地先から旭警察署の東側を經由し、旭中央病院に至る道路を整備する。 L=3,200m,W=11.5m	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
円滑な交通網を整備することにより、国道及び市街地の慢性的な交通渋滞を解消し、交通利便性の向上や歩行者の安全性の確保を図る。	旭中央病院周辺では慢性的な交通渋滞が発生し、緊急車両等の通行に支障をきたしている。	

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(29年度の決算) 単位:千円		単位	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(予算)
1. 工事請負費	82,358	道路改良工事	0	0	53,702	82,358	388,800
2. 公有財産購入費	30,798	道路用地購入費	46,475	21,914	90,286	30,798	33,230
3. 補償補填及び賠償金	6,389	補償補填及び賠償金	29,348	62,263	173,082	6,389	4,406
4. 委託料	648	調査・測量委託料	18,038	2,624	3,043	648	2,854
5. その他	0	土地等借上料	0	0	249	0	0
② 特定財源の内訳(29年度の決算) 単位:千円		事業費計(A)					
1. 国庫支出金	10,649	社会資本整備総合交付金	93,861	86,801	320,362	120,193	429,290
2. 都道府県支出金	0			11,990	34,206	10,649	132,000
3. 地方債	95,700	旭中央病院アクセス道整備事業債	71,000	68,500	243,100	95,700	282,400
4. その他	192	繰越金	10,368		16,054	192	
			12,493	6,311	27,002	13,652	14,890

前年度増減理由	取得済用地が増加し、公有財産購入費・補償補填及び賠償金は減少するが、整備可能延長が増加し、工事請負費が増加するため
---------	---

従事職員数 常時 2人 最大 人 × 日 = 延べ 0人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	⇒	③ 活動指標名	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
	29年度実績(29年度に行った主な活動) 道路改良工事 L=220m 用地買収 11件 A=2,949.1㎡ 物件補償 3件 ビニールハウス外		ア 整備延長(単年度)	m	0	0	0	220	1,200
			イ 用地取得率(面積ベース)	%	36.0	61.3	84.4	94.6	100.0
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
	対象意図 市道及び利用者 安全かつ円滑な交通の確保		ア 道路整備延長	m	900	900	900	1,120	2,320
	対象意図		イ 整備率	%	28.1	28.1	28.1	35.0	69.4

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果			② コスト削減優先度評価結果			
施策貢献度	大きい	成果向上余地 かなりある	評価結果	コスト比率		
	普通	ある程度ある		下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	小さい	ほとんどない		①	②	③
			④⑤	⑥	⑦⑧	
			⑨			

(5) 成果指標の動向

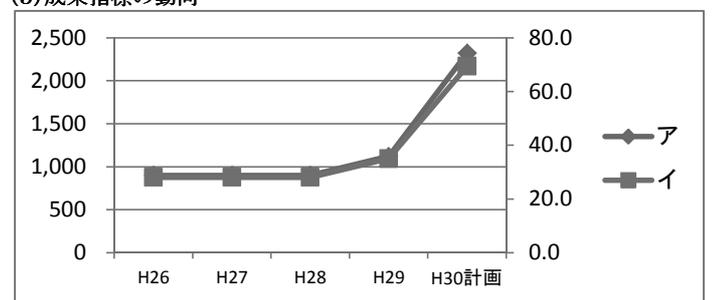

(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難	
【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)		
② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ
【コメント】 (低下の場合、その理由)	成果指標のタイプ	数値増=成果向上 <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下
	比較	25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
	ア	0 0 0 220 1,200
	イ	0.0 0.0 0.0 6.9 34.4
③ 今年度取組事項 (30年度に取り組む主な事項について記載)	時期	内容
	平成30年度	未取得用地の用地買収を行う。 取得済用地の道路改良工事を行う。
	今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> その他 ( )
		事業計画に沿った道路改良工事を実施し、成果(整備率)の向上を図る
