

事務事業評価シート 平成 29 年度事後評価・決算

平成 31 年 2 月 21 日時点

事務事業名		コード	30000 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業	予算科目	会計	款	項	目	事業種別
基本施策		18	安全で快適な道路の整備	根拠法令	特になし				☒ 主な事業
施策の展開		33	主要道路の整備	戦略事業	159	飯岡海上連絡道の整備			☐ 国土強靱化地域計画
施策の展開				戦略事業					☒ 新市建設計画
									☒ 定住自立圏構想
									☒ 主要事業

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間		② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	
☐ 単年度繰返 ☐ 平成 年度～ ☐ 開始年度不詳 ☒ 期間限定複数年度 平成 21 年度～ 平成 31 年度まで		交流基盤を強化するため、飯岡三川地区と海上蛇園地区を連絡する新設道路を整備する事業である。 整備後は、東総広域農道から国道126号までを直結できるため、広域的な道路網が形成され地域間交流の活性化が期待できる。	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状		④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
1市3町合併時に策定した新市建設計画の主要施策として事業化したものである。		事業費が一般的な道路整備に比べて大きいため、その財源確保が課題となっている。	事業費が大きいことから、事業の必要性が問われている。

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細 (29年度の決算)		単位	千円	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (予算)
1.委託料	417	不動産鑑定業務 2件	千円	387	3,899	234	417	11,593
2.工事請負費	6,670	道路改良工事 1件	千円	121,409	55,543	33,687	6,670	54,000
3.用地費	12,362	道路用地 2,538m	千円	0	0	7,840	12,362	43,292
4.補償費	0		千円	0	1,474	6,352	0	1,905
事業費計 (A)		千円	121,796	60,916	48,113	19,449	110,790	
② 特定財源の内訳 (29年度の決算)		単位	千円	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (予算)
1.国庫支出金	0		千円	21,439				22,000
2.都道府県支出金	0		千円					
3.地方債	18,200	合併特別債	千円	86,500	49,900	45,400	18,200	84,300
4.その他	0	繰越金	千円	6,180	10,406	518		
5.一般財源		千円	7,677	610	2,193	1,249	4,490	

前年度増減理由	他団体事業との重複箇所があり、その進捗に併せ本事業を実施しているため
---------	------------------------------------

従事職員数 常時 4人 最大 4人 × 200日 = 延べ 800人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	⇒	③ 活動指標名	単位	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (計画)
	29年度実績 (29年度に行った主な活動) 道路用地取得 A=2,538㎡		ア 整備延長 (単年度)	m	300	0	210	0	350
			イ						
目的	② 対象・意図 (対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (計画)
	対象 市民 意図 道路整備により地域間が結ばれ、地域間交流の活性化が図れる 対象 道路利用者 意図 道路整備により、安全且つ快適な移動と渋滞回避が望める		ア 道路整備延長	m	910	910	1,120	1,120	1,530
			イ 整備率	%	38.8	38.8	47.7	47.7	65.2

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果		成果向上余地		
施策貢献度	大きい	かなりある	ある程度ある	ほとんどない
	普通		⑤	
	小さい			
② コスト削減優先度評価結果		コスト比率		
評価結果	①	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	②			
	③			
	④⑤	(4)		
	⑥			
	⑦⑧			
	⑨			

(5) 成果指標の動向

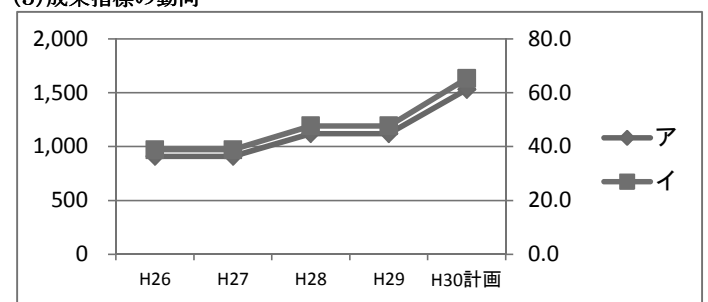

(6) 事務事業に関する評価

評価内容	① 進捗状況	☐ 完了 ☐ 順調 ☒ 概ね順調 ☐ 停滞 ☐ 実施困難											
	【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)												
	② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値増＝成果向上	☐ 向上	☒ 横ばい	☐ 低下	比較 成果動向	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
	【コメント】 (低下の場合、その理由)	成果指標イ	数値増＝成果向上	☐ 向上	☒ 横ばい	☐ 低下	26年度		27年度	28年度	29年度	30計画	
	③ 今年度取組事項 (30年度に取り組む主な事項について記載)	時期	内容				今後の方向性	☒ 現状維持	☐ 見直し	☐ その他()			
	随時	用地取得箇所につき順次、道路改良工事へ取り組む				☐ 拡大 ☐ 縮小		☐ 廃止・休止					
