

事務事業評価シート 平成 29 年度事後評価・決算

平成 31 年 2 月 21 日時点

事務事業評価シート					平成 29 年度事後評価・決算		所管課		建設課		担当班		土木班	
事務事業名		コード	30110 震災復興・津波避難道路整備事業	予算科目		会計	款	項	目	事業種別	☒ 主な事業			
①		18		一般		8	2	3	☒ 国土強靱化地域計画					
施策体系	基本施策	33	安全で快適な道路の整備	根拠法令	道路法									
	施策の展開	18	主要道路の整備	戦略事業	161	震災復興・津波避難道路整備事業								
	施策の展開	56	防災施設の整備	戦略事業	250	震災復興・津波避難道路整備事業								
										事業種別	☐ 新市建設計画			
											☐ 定住自立圏構想			
											☒ 主要事業			

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるように記述する、行政用語は使わない		
☐ 単年度繰返 ☐ 平成 年度～ ☐ 開始年度不詳 ☒ 期間限定複数年度 平成 25 年度～ 平成 32 年度まで	東日本大震災の津波被災地域における避難道路の整備及び被災地域の復興のための重要路線の整備を実施する。 横根・三川線(飯岡地区と津波避難場所である飯岡中学校を結ぶ路線) L=1.3km (平成25～28年度) 椎名内・西足洗線(椎名内地区と災害拠点病院及び防災拠点である旭中央病院を結ぶ路線) L=3.0km (平成26～32年度)		
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等	
災害時の避難道路の確保や被災地域と防災拠点のアクセス向上をはかるため。	用地取得の進捗が課題。	住民からは事業の早期完了が求められている。	

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(29年度の決算)		単位	千円	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(予算)
1. 道路改良工事	49,255	1-064号線 道路改良工事	千円	0	81,000	10,400	49,255	352,253
2. 補償金	138,062	物件補償費	千円	0	48,652	138,062	138,062	155,360
3. 委託料	20,728	不動産鑑定、物件調査、測量調査、道路詳細設計	千円	22,558	73,833	38,307	20,728	14,386
4. 用地購入費	34,704	道路用地購入	千円	0	0	93,902	34,704	135,879
5. その他	15	旅費	千円	4	16	20	15	48
② 特定財源の内訳(29年度の決算)		単位	千円	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(予算)
1. 国庫支出金	56,950	社会資本整備総合交付金	千円	22,562	154,849	191,281	242,764	657,926
2. 都道府県支出金	0		千円	7,150	25,850	42,374	56,950	91,300
3. 地方債	0		千円					
4. その他	91,871	東日本大震災復興交付金繰入金 ほか	千円	7,407	99,045	51,723	91,871	310,096
		一般財源	千円	8,005	29,954	97,184	93,943	256,530

前年度増減理由	工事費及び補償費の増による
---------	---------------

従事職員数	常時	4 人	最大	6 人	×	150 日	=	延べ	900 人
-------	----	-----	----	-----	---	-------	---	----	-------

(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	③ 活動指標名	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
	29年度実績(29年度に行った主な活動)	用地取得率(横根・三川線)	%	0	0	18	55	80
ア	用地取得・補償 道路改良工事	用地取得率(椎名内・西足洗線)	%	0	0	43	61	98
		整備延長(横根・三川線)	m	0	240	240	240	1,060
イ		整備延長(椎名内・西足洗線)	m	0	0	0	220	500

目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
	対象意図 市民 災害時の避難道路の確保	ア 供用済延長(横根・三川線)	m	0	240	240	240	1,300
対象意図		イ 供用済延長(椎名内・西足洗線)	m	0	0	0	0	0

(4) 事務事業優先度評価の結果


① 成果優先度評価結果

		成果向上余地		
		かなりある	ある程度ある	ほとんどない
施策貢献度	大きい		②	
	普通			
	小さい			

② コスト削減優先度評価結果

		コスト比率		
		下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
評価結果	①			
	②	優先度評価対象外		
	③			
	④⑤			
	⑥			
	⑦⑧			
	⑨			

(5) 成果指標の動向

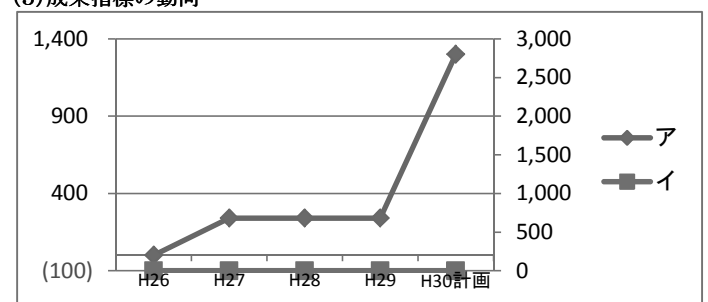

(6) 事務事業に関する評価

評価内容	① 進捗状況	② 成果の状況	③ 今年度取組事項	④ 今後の方向性
	完了 ☐ 完了 ☐ 順調 ☐ 概ね順調 ☒ 停滞 ☐ 実施困難	成果指標 成果指標 A 成果指標 I	時期 H30年度	内容 引き続き用地交渉を行い、用地取得済箇所から道路改良工事を行う。
【コメント】 (低下の場合、その理由)	用地買収の交渉が難航している。			
	数値増＝成果向上 ☐ 向上 ☒ 横ばい ☐ 低下 数値増＝成果向上 ☐ 向上 ☒ 横ばい ☐ 低下			
【コメント】 (低下の場合、その理由)	比較 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30計画 ア 0 240 0 0 1,060 イ 0 0 0 0 0			
	現状維持 ☒ 見直し ☐ 廃止・休止 ☐ その他 ()			
