

事務事業評価シート 平成 30 年度事後評価・決算

令和 2 年 2 月 21 日時点

事務事業名	コード	30100	南堀之内バイパス整備事業	予算科目	会計	款	項	目	事業種別	土木班	
					一般	8	2	3			
施策体系	基本施策	18	安全で快適な道路の整備	根拠法令						事業種別	土木班
	施策の展開	33	主要道路の整備	戦略事業	160	南堀之内バイパスの整備					
	施策の展開			戦略事業							
									事業種別	土木班	

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	
☒ 単年度繰返 ☒ 平成 19 年度～ ☐ 開始年度不詳 ☐ 期間限定複数年度 平成 年度～ 平成 年度まで	国道126号線から、(主)大栄・栗源・干潟線までを結ぶ本路線を整備することで、広域的なネットワークが確立され、首都圏へのアクセスも多様化するなど地域の産業振興の発展と生活基盤の活性化が図られる。	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
【開始の経緯】 ①産業振興の発展 ②通勤時間帯の渋滞緩和・利便性の向上	【課題】 用地買収が難航し、工事発注が困難	早期完了を望む要望が多数有

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(30年度の決算)		単位:千円
1.委託費	0	
2.工事費	7,624	道路改良工事
3.用地費	0	
4.補償費	791	物件補償費
② 特定財源の内訳(30年度の決算)		単位:千円
1.国庫支出金	0	
2.都道府県支出金	0	
3.地方債	0	南堀之内遊正線整備事業債
4.その他	0	

事業費	費目内訳	単位	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(決算)	31年度(予算)
事業費	1.委託費	千円	0	5,692	0	0	27,390
	2.工事費	千円	0	0	9,213	7,624	22,000
	3.用地費	千円	0	0	0	0	6,532
	4.補償費	千円	0	0	0	791	1,878
事業費計 (A)		千円	0	5,692	9,213	8,415	57,800
財源	1.国庫支出金	千円					
	2.都道府県支出金	千円					
	3.地方債	千円			8,700		54,900
	4.その他	千円					
5.一般財源		千円	0	5,692	513	8,415	2,900

前年度増減理由 工事延長の減による

従事職員数 常時 2 人 最大 人 × 日 = 延べ 0 人

(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標


手段	① 主な活動	③ 活動指標名	単位	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	31年度(計画)
	30年度実績(30年度に行った主な活動)	ア 用地買収率(面積ベース)	%	86.0	86.0	86.0	99.0	100.0
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	イ 整備延長	m	0	0	0	0	140
	対象意図 利用者(市民) 安全・安心かつ円滑な道路交通の確保が図れる 対象意図 市道 安全性の向上	④ 成果指標名	単位	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	31年度(計画)
成果		ア 工事進捗率	%	46.0	46.0	46.0	46.0	58.8
		イ 道路整備済延長	m	495	495	495	495	635

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果		成果向上余地		
		かなりある	ある程度ある	ほとんどない
施策貢献度	大きい			
	普通			⑦
	小さい			

② コスト削減優先度評価結果		コスト比率		
		下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
評価結果	①			
	②			
	③			
	④⑤			
	⑥			
	⑦⑧	(7)		
	⑨			

(5) 成果指標の動向

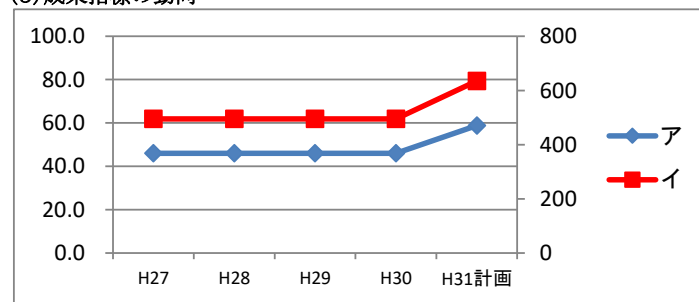

(6) 事務事業に関する評価

評価内容	① 進捗状況	☐ 完了 ☐ 順調 ☒ 概ね順調 ☐ 停滞 ☐ 実施困難				
	【コメント】(停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)					
	② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値増＝成果向上	数値減＝成果向上	数値増＝成果向上
	【コメント】(低下の場合、その理由)					
③ 今年度取組事項(31年度に取り組む主な事項について記載)	時期	令和元年度				今後の方角性
	内容	未取得用地の用地買収を行う。買収済用地の道路改良工事を進める。				令和元年度以降継続
		拡大 ☐ 縮小 ☐		現状維持 ☒ 廃止・休止 ☐		見直し ☐ その他()
