

事務事業名	29900 旭中央病院アクセス道整備事業	予算科目	会計 一般	款 8	項 2	目 3	所管課	建設課	担当班	土木班	事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input checked="" type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input checked="" type="checkbox"/> 新市建設計画 <input checked="" type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業
施策体系	基本施策 18 安全で快適な道路の整備 施策の展開 33 主要道路の整備	根拠法令	道路法	戦略事業 158 旭中央病院アクセス道の整備(南北線)			戦略事業					

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるように記述する、行政用語は使わない	③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 平成 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 18 年度～ 令和 2 年度まで	東総広域農道琴田地先から旭警察署の東側を経由し、旭中央病院に至る道路を整備する。 L=3,200m,W=11.5m	円滑な交通網を整備することにより、国道及び市街地の慢性的な交通渋滞を解消し、交通利便性の向上や歩行者の安全性の確保を図る。	旭中央病院周辺では慢性的な交通渋滞が発生し、緊急車両等の通行に支障をきたしている。	特になし

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(1年度の決算) 単位:千円	
1.工事請負費	202,329 道路改良工事
2.公有財産購入費	860 道路用地購入費
3.補償補填及び賠償金	補償金
4.委託料	601 調査・測量委託料
5.その他	土地等借上料
② 特定財源の内訳(1年度の決算) 単位:千円	
1.国庫支出金	42,200 社会資本整備総合交付金
2.都道府県支出金	
3.地方債	153,300 旭中央病院アクセス道整備事業債
4.その他	繰越金

費目内訳	単位	28年度	29年度	30年度	1年度	2年度
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(予算)
1.工事請負費	千円	53,702	82,358	214,923	202,329	308,000
2.公有財産購入費	千円	90,286	30,798	10,298	860	
3.補償補填及び賠償金	千円	173,082	6,389	3,656		350
4.委託料	千円	3,043	648	1,873	601	550
5.その他	千円	249	227			
事業費計(A)		千円 320,362	120,193	230,977	203,790	308,900
財源						
1.国庫支出金	千円	34,206	10,649	31,166	42,200	80,000
2.都道府県支出金	千円					
3.地方債	千円	243,100	95,700	186,900	153,300	217,400
4.その他	千円	16,054	192			
5.一般財源	千円	27,002	13,652	12,911	8,290	11,500

前年度増減理由	整備延長が減少し、工事請負費が減少した。また、取得済用地が増加し、公有財産購入費・補償補填及び賠償金が減少した。
---------	--

従事職員数 常時 2 人 最大 人 × 日 = 延べ 人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	③ 活動指標名	単位	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(計画)
	1年度実績(1年度に行った主な活動)							
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	単位	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(計画)
	対象意図 市道及び利用者 安全かつ円滑な交通の確保 対象意図							
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	単位	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(計画)
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	単位	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	1年度(実績)	2年度(計画)

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果			② コスト削減優先度評価結果			
施策貢献度	成果向上余地			コスト比率		
	大きい	かなりある	ある程度ある	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	普通				(2)	
	小さい					
評価結果	①					
	②					
	③					
	④⑤					
	⑥					
	⑦⑧					
	⑨					

(5) 成果指標の動向

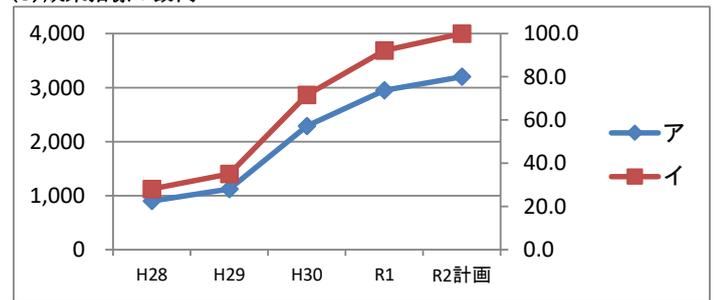

(6) 事務事業に関する評価

評価内容	① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難
	② 成果の状況	成果指標ア 成果指標のタイプ <input checked="" type="checkbox"/> 数値増=成果向上 <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 成果指標イ <input checked="" type="checkbox"/> 数値増=成果向上 <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 【コメント】(低下の場合、その理由) 比較 27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 ア 0 220 1,171 660 249 イ 0.0 6.9 36.6 20.6 7.8
	③ 今年度取組事項(2年度に取り組む主な事項について記載)	時期 令和2年度 内容 取得済用地の道路改良工事を行う 今後の方向性 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> その他(完了)
